



Gayrimenkul Sertifikası

Damla Kent Projesi

Proje Adı: Damla Kent
Proje Geliştiricisi: Emlak Konut GYO
Garantör ve Arsa Sahibi: TOKİ
Sertifika Kodu: DMLKT.G



Proje Hava Görşeli



Proje İlerlemesi

Ana İş Grubu	15.10.2026 İlerlemesi
Üstyapı İnşaatları	%23,13
Altyapı ve Çevre Düzenleme	%9,0
Resmi ve İdari İşlemler	%55,0
Proje Geneli Kümülatif İlerleme	%29,32

Güncel Asli Edim Durumu

Toplam Daire	Gerçekleşen Asli Edim	Kalan Daire
2.214 Adet	525 Adet*	1.689 Adet

*Asli Edimi gerçekleştiren detaylı daire listesi Ek'te yer almaktadır.

Etaplara Göre Gerçekleşen Asli Edim

A Etabı	B Etabı
361 Adet	164 Adet

Daire Türlerine Göre Gerçekleşen Asli Edim

1+1	2+1	3+1	4+1
156 Adet	260 Adet	88 Adet	21 Adet

Proje Takvimi

14.08 2025 Borsada İşlem Görme Başlangıcı	06.11 2025 Proje İnşaat Başlangıcı	26.11 2025 Asli Edim Kullanım Süresi Başlangıcı	11.08 2028 Asli Edim Kullanım Süresi Bitişi	09.02 2029 Proje İnşaat Bitişi (Tahmini)
10.07 2029 Edim Değişikliği Talep Edilebilecek Son Tarih	03.08 2029 Borsada Son İşlem Görme	07.08 2029 Tali Edim İfa Süresi Bitişi	10.08 2029 Asli Edim İfa Süresi Bitişi	15.08 2029 Vade Tarihi (Tali Edim İfa Tarihi)

Proje Görselleri




Damla Kent Projesi'nin A ve B etapları, projenin ana ulaşım akslarına en yakın ve ticari hareketliliğin yoğunlaştığı öncelikli fazlar olarak kurgulanmıştır. Yatay mimari prensibiyle zemin üzerine 6 kat olarak tasarlanan bu etaplar, hem geniş peyzaj alanlarına hem de projenin sunduğu eğitim ve sosyal tesis imkanlarına doğrudan erişim avantajı sağlamaktadır.

Aile odaklı 2+1 ve 3+1 daire tipolojilerinin ağırlıkta olduğu bu bölümler, modern altyapı donatıları ve çevreci sistemleriyle projenin sürdürülebilir yaşam standartlarını ilk aşamada hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Etap Daire Dağılımı

2.214
Bağımsız
Bölüm

521
Bin m²
İnşaat Alanı

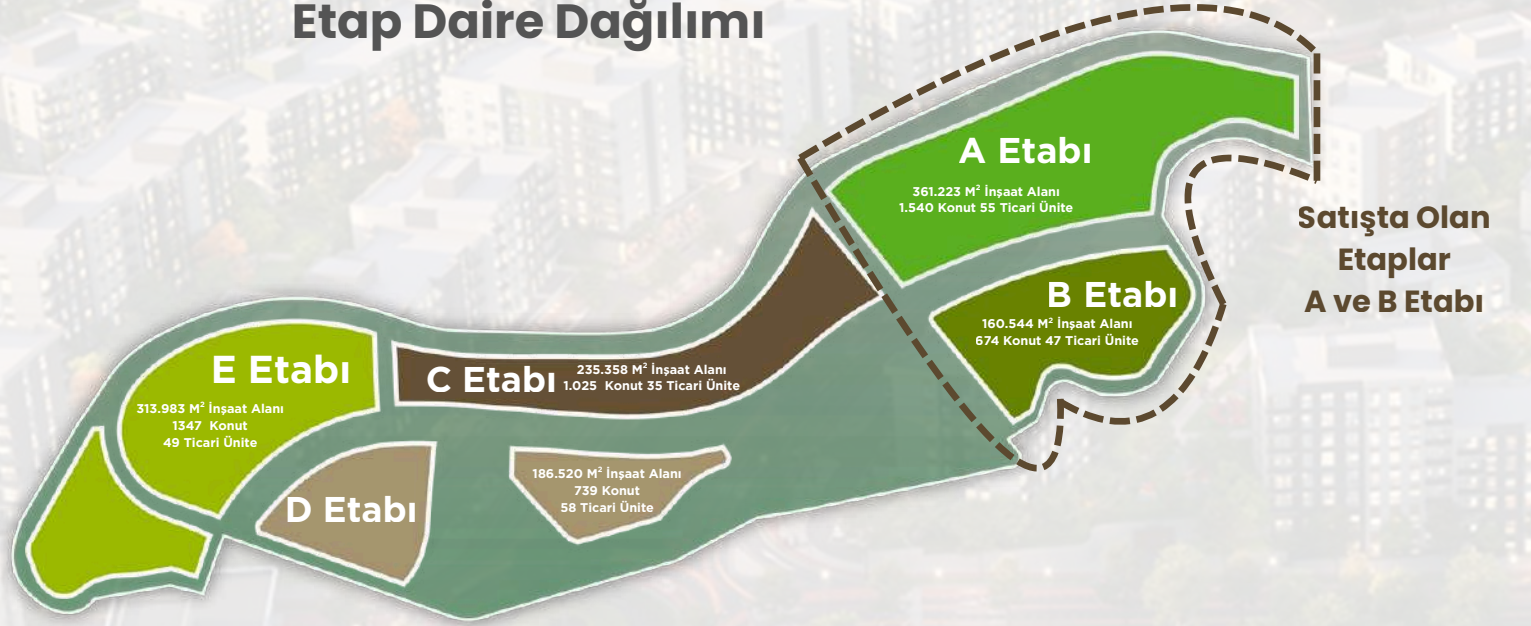

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
1	B ETAP A11	4. KAT	17	1.486.392
2	A ETAP C14	1. KAT	10	914.566
3	B ETAP C2	3. KAT	26	923.331
4	A ETAP C1	4. KAT	30	1.430.960
5	A ETAP C6	ZEMİN KAT	1	758.825
6	A ETAP D2	5. KAT	20	1.981.351
7	B ETAP A4	6. KAT	27	1.149.657
8	B ETAP A5	4. KAT	23	1.458.218
9	B ETAP C4	3. KAT	27	1.482.461
10	B ETAP C4	4. KAT	30	957.310
11	B ETAP C4	2. KAT	17	934.994
12	A ETAP A4	3. KAT	13	1.093.027
13	A ETAP C16	2. KAT	13	716.495
14	A ETAP A1	4. KAT	21	1.110.421
15	A ETAP C5	ZEMİN KAT	1	759.507
16	B ETAP A4	5. KAT	23	1.138.220
17	A ETAP E2	2. KAT	9	1.932.076
18	B ETAP E3	4. KAT	12	2.028.603
19	A ETAP A3	2. KAT	11	1.081.286
20	B ETAP E4	5. KAT	14	1.996.033
21	B ETAP A3	4. KAT	20	1.112.697
22	A ETAP D2	3. KAT	15	1.470.061
23	A ETAP C18	2. KAT	13	729.918
24	A ETAP E2	3. KAT	11	1.945.918
25	B ETAP A2	5. KAT	19	1.489.711
26	A ETAP C16	4. KAT	25	729.470
27	B ETAP A8	3. KAT	14	1.125.082
28	B ETAP C4	4. KAT	33	1.495.978
29	A ETAP C5	2. KAT	14	907.171
30	B ETAP A11	5. KAT	21	1.505.310
31	B ETAP A8	2. KAT	12	1.433.314
32	B ETAP C3	1. KAT	10	695.701
33	A ETAP C1	4. KAT	26	911.558
34	A ETAP D7	ZEMİN KAT	7	2.075.645
35	B ETAP A5	3. KAT	20	1.457.064
36	B ETAP A5	4. KAT	22	1.103.176
37	B ETAP A7	4. KAT	19	1.127.914
38	B ETAP A7	6. KAT	28	1.136.191
39	B ETAP A7	1. KAT	8	1.078.602
40	B ETAP A7	4. KAT	17	1.446.538
41	A ETAP C6	4. KAT	26	922.986
42	A ETAP F1	1. KAT	8	1.582.704
43	B ETAP A7	2. KAT	12	1.087.144
44	B ETAP A7	5. KAT	23	1.142.071
45	B ETAP C4	5. KAT	39	1.504.668
46	A ETAP A12	3. KAT	17	1.129.539
47	A ETAP D2	1. KAT	4	1.378.974
48	B ETAP A5	1. KAT	9	1.089.488
49	B ETAP C2	4. KAT	34	895.331
50	B ETAP A4	3. KAT	17	1.459.708

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
51	B ETAP A8	5. KAT	24	1.479.598
52	A ETAP A18	1. KAT	6	1.224.796
53	A ETAP F5	2. KAT	10	1.578.881
54	B ETAP F4	2. KAT	8	1.609.678
55	B ETAP A5	2. KAT	13	1.101.536
56	B ETAP F5	1. KAT	6	1.553.491
57	A ETAP A2	4. KAT	19	1.440.243
58	B ETAP A4	1. KAT	6	1.107.155
59	B ETAP A7	5. KAT	21	1.465.430
60	B ETAP A3	5. KAT	24	1.126.886
61	B ETAP A7	1. KAT	5	1.194.444
62	B ETAP A7	6. KAT	27	1.156.228
63	A ETAP A13	4. KAT	19	1.144.376
64	A ETAP C5	4. KAT	27	923.181
65	A ETAP C8	5. KAT	35	967.414
66	B ETAP A5	3. KAT	17	1.112.165
67	B ETAP C3	3. KAT	25	936.064
68	A ETAP E1	3. KAT	11	1.945.918
69	B ETAP A3	5. KAT	23	1.146.797
70	A ETAP A2	1. KAT	8	1.183.521
71	A ETAP C8	6. KAT	42	961.129
72	A ETAP C6	5. KAT	32	934.733
73	A ETAP F5	2. KAT	9	1.573.799
74	A ETAP C8	4. KAT	31	904.529
75	A ETAP A18	4. KAT	18	1.451.642
76	B ETAP B1	2. KAT	19	1.246.141
77	A ETAP C17	ZEMİN KAT	4	717.390
78	A ETAP F4	1. KAT	8	1.561.100
79	A ETAP C9	2. KAT	16	897.260
80	A ETAP A11	4. KAT	20	1.449.288
81	A ETAP C17	1. KAT	7	722.312
82	A ETAP B3	ZEMİN KAT	9	753.286
83	A ETAP C10	ZEMİN KAT	1	752.250
84	B ETAP C2	2. KAT	21	907.764
85	B ETAP A3	3. KAT	16	1.102.764
86	A ETAP C16	ZEMİN KAT	4	703.967
87	A ETAP C6	1. KAT	10	871.439
88	A ETAP C6	3. KAT	20	914.763
89	B ETAP C3	5. KAT	36	983.629
90	A ETAP A6	1. KAT	5	1.072.201
91	A ETAP B3	ZEMİN KAT	10	764.013
92	A ETAP C14	ZEMİN KAT	4	697.541
93	A ETAP C15	ZEMİN KAT	4	703.967
94	B ETAP A4	2. KAT	10	1.119.358
95	A ETAP A18	3. KAT	15	1.098.806
96	B ETAP A4	3. KAT	14	1.130.125
97	A ETAP C12	5. KAT	34	711.312
98	B ETAP A8	1. KAT	8	1.206.474
99	B ETAP A8	ZEMİN KAT	4	1.340.134
100	B ETAP A11	1. KAT	5	1.228.236

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
101	B ETAP E3	5. KAT	13	1.986.012
102	B ETAP E3	5. KAT	14	2.039.877
103	B ETAP F5	2. KAT	7	1.566.157
104	A ETAP C15	2. KAT	15	933.418
105	A ETAP C18	ZEMİN KAT	4	717.390
106	A ETAP C3	3. KAT	21	892.559
107	B ETAP A11	4. KAT	20	1.107.265
108	B ETAP A3	4. KAT	19	1.132.668
109	A ETAP C5	3. KAT	21	914.903
110	A ETAP C8	5. KAT	36	951.586
111	A ETAP C10	2. KAT	14	901.253
112	A ETAP C18	4. KAT	25	742.893
113	A ETAP D2	4. KAT	19	1.483.678
114	B ETAP A5	4. KAT	21	1.122.087
115	B ETAP A5	5. KAT	25	1.128.465
116	B ETAP A7	6. KAT	25	1.484.321
117	A ETAP A3	6. KAT	27	1.130.197
118	A ETAP F3	2. KAT	9	1.573.799
119	B ETAP A4	6. KAT	26	1.158.120
120	A ETAP B2	3. KAT	32	1.256.526
121	A ETAP C17	4. KAT	25	742.893
122	A ETAP C15	3. KAT	21	942.615
123	A ETAP C1	2. KAT	14	894.627
124	A ETAP A1	3. KAT	17	1.100.452
125	A ETAP C14	3. KAT	23	907.131
126	A ETAP C5	4. KAT	26	924.228
127	B ETAP C5	4. KAT	30	981.236
128	B ETAP F5	2. KAT	8	1.576.278
129	B ETAP C3	ZEMİN KAT	4	773.113
130	A ETAP C14	2. KAT	16	924.894
131	A ETAP C14	3. KAT	22	934.006
132	A ETAP F5	1. KAT	7	1.556.036
133	A ETAP F5	ZEMİN KAT	5	1.540.267
134	A ETAP A2	4. KAT	17	1.097.992
135	B ETAP A8	5. KAT	22	1.149.150
136	B ETAP C4	ZEMİN KAT	4	779.662
137	B ETAP F2	2. KAT	8	1.565.145
138	A ETAP C12	ZEMİN KAT	4	682.500
139	A ETAP C8	4. KAT	30	946.218
140	B ETAP C4	4. KAT	29	952.249
141	B ETAP A4	4. KAT	18	1.140.175
142	A ETAP A7	4. KAT	19	1.116.020
143	A ETAP C10	6. KAT	37	709.300
144	A ETAP C18	1. KAT	7	722.312
145	B ETAP F1	2. KAT	8	1.609.364
146	B ETAP F2	2. KAT	7	1.566.157
147	A ETAP C11	4. KAT	28	710.052
148	A ETAP C15	1. KAT	7	708.889
149	B ETAP C3	4. KAT	29	950.464
150	A ETAP C15	2. KAT	13	716.495

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
151	B ETAP A2	6. KAT	26	1.176.190
152	B ETAP A5	4. KAT	24	1.470.247
153	B ETAP C3	5. KAT	35	955.819
154	B ETAP F1	3. KAT	10	1.624.543
155	A ETAP A2	3. KAT	13	1.088.071
156	A ETAP C1	2. KAT	15	899.372
157	A ETAP C6	5. KAT	35	1.480.193
158	A ETAP C7	1. KAT	10	693.850
159	B ETAP A11	ZEMİN KAT	1	1.361.398
160	A ETAP C11	ZEMİN KAT	4	763.950
161	A ETAP C3	1. KAT	9	876.460
162	A ETAP C12	2. KAT	16	694.723
163	A ETAP A3	4. KAT	20	1.127.910
164	A ETAP C11	3. KAT	22	703.917
165	A ETAP C12	3. KAT	22	701.271
166	A ETAP C5	2. KAT	15	906.035
167	A ETAP C7	5. KAT	34	717.860
168	B ETAP A8	4. KAT	20	1.460.707
169	B ETAP F1	3. KAT	9	1.581.030
170	B ETAP A4	5. KAT	22	1.146.635
171	A ETAP C5	1. KAT	8	899.525
172	A ETAP C7	3. KAT	22	707.820
173	A ETAP C9	ZEMİN KAT	1	753.069
174	A ETAP C12	4. KAT	28	707.383
175	A ETAP D1	5. KAT	23	1.979.587
176	A ETAP E2	3. KAT	12	2.000.027
177	A ETAP A2	2. KAT	9	1.077.441
178	B ETAP A2	3. KAT	14	1.137.542
179	B ETAP C3	3. KAT	23	942.134
180	B ETAP A3	3. KAT	15	1.122.779
181	B ETAP C1	ZEMİN KAT	4	704.814
182	A ETAP C11	2. KAT	16	697.344
183	A ETAP C14	3. KAT	20	716.604
184	A ETAP C8	6. KAT	40	735.937
185	A ETAP D1	3. KAT	13	1.448.867
186	B ETAP E3	2. KAT	7	1.938.410
187	B ETAP C2	1. KAT	16	869.271
188	B ETAP E1	5. KAT	14	2.039.877
189	A ETAP C14	2. KAT	14	709.954
190	A ETAP C17	3. KAT	19	736.629
191	B ETAP A6	3. KAT	16	1.126.339
192	A ETAP C7	2. KAT	16	701.271
193	A ETAP F2	1. KAT	8	1.576.291
194	A ETAP C17	2. KAT	13	729.918
195	A ETAP C5	5. KAT	31	708.009
196	A ETAP C12	1. KAT	10	687.302
197	A ETAP C14	2. KAT	17	898.309
198	B ETAP C3	3. KAT	24	969.871
199	B ETAP C5	3. KAT	23	967.719
200	A ETAP C6	5. KAT	36	1.506.440

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
201	B ETAP A8	3. KAT	16	1.447.483
202	A ETAP C15	3. KAT	19	723.206
203	A ETAP C2	1. KAT	7	674.116
204	A ETAP C5	2. KAT	16	880.086
205	A ETAP C7	4. KAT	28	713.931
206	A ETAP C9	2. KAT	15	929.685
207	A ETAP C7	4. KAT	31	915.692
208	B ETAP A3	3. KAT	14	1.441.848
209	A ETAP C2	3. KAT	19	686.113
210	B ETAP C1	4. KAT	25	729.964
211	A ETAP C5	3. KAT	19	693.335
212	A ETAP C16	3. KAT	19	723.206
213	A ETAP C5	2. KAT	13	686.860
214	B ETAP A7	3. KAT	13	1.433.314
215	B ETAP C5	2. KAT	17	958.794
216	A ETAP C1	4. KAT	28	887.242
217	A ETAP B3	3. KAT	28	1.224.796
218	A ETAP C6	4. KAT	28	895.449
219	B ETAP C1	1. KAT	7	709.667
220	A ETAP C1	1. KAT	9	891.742
221	A ETAP C1	2. KAT	16	870.763
222	A ETAP C1	3. KAT	22	879.287
223	A ETAP C14	1. KAT	8	702.418
224	A ETAP C5	1. KAT	7	681.250
225	A ETAP C1	1. KAT	10	863.376
226	A ETAP C4	1. KAT	7	681.250
227	A ETAP C5	4. KAT	25	699.377
228	A ETAP D1	ZEMİN KAT	3	2.051.536
229	B ETAP A2	1. KAT	5	1.323.068
230	A ETAP C9	1. KAT	8	894.820
231	B ETAP A7	4. KAT	20	1.107.758
232	B ETAP C3	2. KAT	17	933.209
233	B ETAP A7	3. KAT	16	1.097.806
234	B ETAP C1	2. KAT	13	717.168
235	B ETAP C1	3. KAT	19	723.786
236	B ETAP A2	4. KAT	18	1.147.562
237	B ETAP A2	5. KAT	22	1.161.876
238	B ETAP C1	3. KAT	22	916.809
239	A ETAP A2	2. KAT	12	1.406.217
240	A ETAP D1	4. KAT	19	1.954.456
241	B ETAP C1	3. KAT	21	947.084
242	A ETAP C11	1. KAT	10	689.895
243	A ETAP F3	1. KAT	8	1.561.100
244	A ETAP A4	1. KAT	6	1.061.438
245	A ETAP D2	5. KAT	23	1.503.131
246	A ETAP B2	1. KAT	21	694.380
247	A ETAP B2	2. KAT	29	699.632
248	A ETAP B2	3. KAT	37	704.447
249	A ETAP B3	1. KAT	18	684.006
250	A ETAP B3	2. KAT	26	691.345

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
251	A ETAP B3	3. KAT	34	697.821
252	A ETAP B3	4. KAT	42	703.865
253	A ETAP C10	3. KAT	19	686.022
254	A ETAP C10	4. KAT	25	692.057
255	A ETAP C10	5. KAT	31	700.679
256	A ETAP C13	1. KAT	13	709.322
257	A ETAP C13	2. KAT	19	714.637
258	A ETAP C13	3. KAT	25	719.509
259	A ETAP C13	4. KAT	31	724.381
260	A ETAP C3	1. KAT	6	684.161
261	A ETAP C4	2. KAT	13	686.860
262	A ETAP C4	3. KAT	19	693.335
263	A ETAP C4	4. KAT	25	699.377
264	A ETAP C4	5. KAT	31	708.009
265	A ETAP C6	4. KAT	25	698.523
266	A ETAP C6	5. KAT	31	707.145
267	A ETAP C6	6. KAT	37	715.766
268	B ETAP A8	6. KAT	25	1.146.854
269	A ETAP C6	3. KAT	19	692.488
270	A ETAP C4	2. KAT	16	880.086
271	A ETAP C18	1. BODRUM	2	1.090.810
272	B ETAP A8	2. KAT	9	1.097.806
273	A ETAP C9	5. KAT	31	701.535
274	B ETAP A11	3. KAT	15	1.077.033
275	B ETAP A8	6. KAT	26	1.163.307
276	B ETAP C2	ZEMİN KAT	7	682.400
277	A ETAP F4	1. KAT	7	1.556.036
278	A ETAP C1	5. KAT	31	700.680
279	A ETAP C3	2. KAT	12	689.796
280	A ETAP C3	3. KAT	18	696.298
281	A ETAP C3	4. KAT	24	702.366
282	A ETAP C3	5. KAT	30	711.035
283	B ETAP A7	5. KAT	24	1.121.975
284	B ETAP B1	1. KAT	17	706.451
285	B ETAP B1	2. KAT	25	713.804
286	B ETAP B1	4. KAT	41	726.347
287	B ETAP C3	5. KAT	34	719.715
288	B ETAP C4	5. KAT	34	726.264
289	B ETAP C5	2. KAT	16	709.673
290	B ETAP C5	5. KAT	34	726.264
291	B ETAP E1	4. KAT	11	1.974.737
292	B ETAP A3	4. KAT	18	1.455.107
293	A ETAP C6	1. KAT	7	680.418
294	B ETAP A8	3. KAT	13	1.108.469
295	A ETAP A3	5. KAT	24	1.142.147
296	A ETAP C1	4. KAT	27	916.392
297	A ETAP C18	3. KAT	21	954.878
298	B ETAP C2	2. KAT	20	914.601
299	A ETAP C9	1. KAT	7	674.775
300	B ETAP C5	3. KAT	22	716.222

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
301	B ETAP E6	6. KAT	15	2.009.219
302	B ETAP C5	1. KAT	10	702.250
303	A ETAP C1	4. KAT	25	692.111
304	B ETAP C2	3. KAT	25	700.769
305	B ETAP C4	1. KAT	10	702.250
306	B ETAP A11	5. KAT	24	1.121.503
307	A ETAP C10	2. KAT	13	679.556
308	B ETAP A4	4. KAT	21	1.473.061
309	B ETAP B1	1. KAT	18	675.075
310	B ETAP C2	1. KAT	13	687.099
311	A ETAP A2	2. KAT	10	1.072.834
312	A ETAP C18	1. BODRUM	1	806.794
313	B ETAP A8	4. KAT	17	1.118.420
314	B ETAP A8	4. KAT	18	1.134.992
315	A ETAP C10	1. KAT	7	673.952
316	B ETAP C5	4. KAT	28	722.335
317	A ETAP A3	4. KAT	19	1.101.843
318	B ETAP C2	2. KAT	19	694.361
319	A ETAP C9	3. KAT	20	911.289
320	A ETAP A3	2. KAT	12	1.107.265
321	A ETAP A2	4. KAT	18	1.093.297
322	B ETAP C2	3. KAT	27	916.541
323	B ETAP F4	2. KAT	7	1.566.157
324	A ETAP D1	1. KAT	8	1.341.188
325	B ETAP A4	5. KAT	25	1.481.645
326	B ETAP C3	3. KAT	22	709.673
327	A ETAP A7	5. KAT	23	1.130.197
328	A ETAP B2	1. KAT	20	662.652
329	A ETAP B2	1. KAT	22	663.592
330	B ETAP B1	3. KAT	33	720.291
331	A ETAP A9	ZEMİN KAT	5	1.245.246
332	A ETAP A2	3. KAT	14	1.083.418
333	B ETAP C2	4. KAT	31	706.750
334	B ETAP C3	2. KAT	18	960.899
335	B ETAP F3	2. KAT	7	1.579.314
336	A ETAP C3	5. KAT	31	937.126
337	A ETAP B3	1. KAT	19	653.675
338	A ETAP C4	ZEMİN KAT	1	759.217
339	B ETAP A1	6. KAT	26	1.131.957
340	B ETAP B1	1. KAT	16	674.214
341	B ETAP C2	3. KAT	28	887.400
342	A ETAP A11	ZEMİN KAT	3	1.200.392
343	A ETAP A3	6. KAT	28	1.156.385
344	A ETAP B2	4. KAT	45	709.262
345	A ETAP C14	4. KAT	26	722.811
346	A ETAP C14	4. KAT	27	955.633
347	A ETAP C14	4. KAT	28	942.512
348	A ETAP C14	4. KAT	29	915.365
349	B ETAP E4	4. KAT	11	1.991.022
350	A ETAP C3	2. KAT	15	883.935

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
351	A ETAP C3	ZEMİN KAT	1	814.489
352	A ETAP C9	2. KAT	13	680.386
353	A ETAP A3	5. KAT	23	1.116.020
354	A ETAP A7	5. KAT	24	1.110.112
355	A ETAP E3	3. KAT	11	1.977.788
356	A ETAP F3	1. KAT	7	1.556.036
357	A ETAP A11	3. KAT	17	1.095.315
358	A ETAP C10	3. KAT	20	910.064
359	A ETAP C3	5. KAT	32	942.038
360	B ETAP A6	5. KAT	23	1.110.232
361	B ETAP F5	3. KAT	10	1.591.460
362	A ETAP C9	3. KAT	19	686.860
363	B ETAP C2	4. KAT	35	1.458.299
364	B ETAP C3	4. KAT	28	715.785
365	A ETAP A1	5. KAT	25	1.116.829
366	A ETAP A1	5. KAT	26	1.114.431
367	A ETAP A13	4. KAT	20	1.114.530
368	A ETAP A3	3. KAT	15	1.091.919
369	A ETAP A3	3. KAT	16	1.117.943
370	A ETAP C18	2. KAT	15	945.681
371	A ETAP C5	3. KAT	22	888.673
372	A ETAP C6	2. KAT	13	686.022
373	A ETAP C8	5. KAT	34	728.971
374	B ETAP A6	5. KAT	24	1.150.433
375	B ETAP A8	2. KAT	10	1.114.464
376	B ETAP E6	6. KAT	16	2.063.170
377	A ETAP A10	1. KAT	3	1.200.977
378	A ETAP A10	1. KAT	4	1.214.595
379	A ETAP A10	1. KAT	5	1.065.030
380	A ETAP A10	1. KAT	6	1.106.199
381	A ETAP A10	2. KAT	10	1.114.838
382	A ETAP A10	2. KAT	7	1.420.188
383	A ETAP A10	2. KAT	8	1.407.648
384	A ETAP A10	2. KAT	9	1.074.338
385	A ETAP A10	3. KAT	11	1.434.520
386	A ETAP A10	3. KAT	12	1.422.047
387	A ETAP A10	3. KAT	13	1.085.079
388	A ETAP A10	3. KAT	14	1.125.624
389	A ETAP A10	4. KAT	15	1.447.896
390	A ETAP A10	4. KAT	16	1.435.486
391	A ETAP A10	4. KAT	17	1.095.103
392	A ETAP A10	4. KAT	18	1.135.691
393	A ETAP A10	5. KAT	19	1.467.005
394	A ETAP A10	5. KAT	20	1.454.685
395	A ETAP A10	5. KAT	21	1.109.424
396	A ETAP A10	5. KAT	22	1.150.072
397	A ETAP A10	6. KAT	23	1.486.114
398	A ETAP A10	6. KAT	24	1.473.883
399	A ETAP A10	6. KAT	25	1.123.745
400	A ETAP A10	6. KAT	26	1.164.454

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
401	A ETAP A10	ZEMİN KAT	1	1.345.691
402	A ETAP A10	ZEMİN KAT	2	1.225.383
403	A ETAP B1	1. KAT	10	1.153.433
404	A ETAP B1	1. KAT	11	1.145.285
405	A ETAP B1	1. KAT	12	1.153.433
406	A ETAP B1	1. KAT	13	1.152.545
407	A ETAP B1	1. KAT	15	661.741
408	A ETAP B1	1. KAT	9	1.152.545
409	A ETAP B1	2. KAT	17	1.162.053
410	A ETAP B1	2. KAT	18	1.163.446
411	A ETAP B1	2. KAT	19	1.155.228
412	A ETAP B1	2. KAT	20	1.163.446
413	A ETAP B1	2. KAT	21	1.162.551
414	A ETAP B1	2. KAT	22	883.785
415	A ETAP B1	2. KAT	24	884.997
416	A ETAP B1	3. KAT	25	1.173.594
417	A ETAP B1	3. KAT	26	1.175.001
418	A ETAP B1	3. KAT	27	1.166.700
419	A ETAP B1	3. KAT	29	1.174.096
420	A ETAP B1	3. KAT	30	892.436
421	A ETAP B1	3. KAT	31	673.517
422	A ETAP B1	3. KAT	32	893.660
423	A ETAP B1	4. KAT	33	1.184.365
424	A ETAP B1	4. KAT	34	1.185.785
425	A ETAP B1	4. KAT	35	1.177.408
426	A ETAP B1	4. KAT	36	1.185.785
427	A ETAP B1	4. KAT	37	1.184.872
428	A ETAP B1	4. KAT	38	900.511
429	A ETAP B1	4. KAT	39	679.405
430	A ETAP B1	4. KAT	40	901.745
431	A ETAP B1	ZEMİN KAT	1	1.316.207
432	A ETAP B1	ZEMİN KAT	2	1.573.681
433	A ETAP B1	ZEMİN KAT	3	1.658.621
434	A ETAP B1	ZEMİN KAT	4	1.574.844
435	A ETAP B1	ZEMİN KAT	5	1.316.174
436	A ETAP B1	ZEMİN KAT	6	735.237
437	A ETAP B1	ZEMİN KAT	7	745.360
438	A ETAP B1	ZEMİN KAT	8	736.170
439	A ETAP C1	1. KAT	7	674.116
440	A ETAP C1	2. KAT	13	679.686
441	A ETAP C1	3. KAT	19	686.113
442	A ETAP C2	1. KAT	10	863.276
443	A ETAP C2	1. KAT	11	1.398.042
444	A ETAP C2	1. KAT	12	1.155.267
445	A ETAP C2	1. KAT	8	892.775
446	A ETAP C2	1. KAT	9	915.116
447	A ETAP C2	2. KAT	14	900.364
448	A ETAP C2	2. KAT	15	922.744
449	A ETAP C2	2. KAT	16	870.662
450	A ETAP C2	2. KAT	17	1.410.377

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
451	A ETAP C2	2. KAT	18	1.408.125
452	A ETAP C2	3. KAT	20	909.120
453	A ETAP C2	3. KAT	22	879.185
454	A ETAP C2	3. KAT	23	1.424.610
455	A ETAP C2	3. KAT	24	1.422.335
456	A ETAP C2	4. KAT	25	692.111
457	A ETAP C2	4. KAT	26	917.292
458	A ETAP C2	4. KAT	27	939.763
459	A ETAP C2	4. KAT	28	887.139
460	A ETAP C2	4. KAT	29	1.437.893
461	A ETAP C2	4. KAT	30	1.435.597
462	A ETAP C2	5. KAT	31	700.680
463	A ETAP C2	5. KAT	32	928.967
464	A ETAP C2	5. KAT	33	951.500
465	A ETAP C2	5. KAT	34	898.502
466	A ETAP C2	5. KAT	35	1.456.871
467	A ETAP C2	5. KAT	36	1.454.544
468	A ETAP C2	ZEMİN KAT	1	752.402
469	A ETAP C2	ZEMİN KAT	2	1.035.798
470	A ETAP C2	ZEMİN KAT	3	1.215.949
471	A ETAP C2	ZEMİN KAT	4	1.147.601
472	A ETAP C2	ZEMİN KAT	5	1.766.662
473	A ETAP C2	ZEMİN KAT	6	1.299.062
474	A ETAP C8	1. BODRUM	1	1.040.500
475	A ETAP C8	1. BODRUM	2	991.173
476	A ETAP C8	1. BODRUM	3	1.586.829
477	A ETAP C8	1. KAT	11	934.779
478	A ETAP C8	1. KAT	12	918.781
479	A ETAP C8	1. KAT	13	877.966
480	A ETAP C8	1. KAT	14	1.431.459
481	A ETAP C8	1. KAT	15	1.194.595
482	A ETAP C8	2. KAT	16	712.427
483	A ETAP C8	2. KAT	17	944.866
484	A ETAP C8	2. KAT	18	928.921
485	A ETAP C8	2. KAT	19	887.783
486	A ETAP C8	2. KAT	20	1.447.853
487	A ETAP C8	2. KAT	21	1.460.020
488	A ETAP C8	3. KAT	22	718.958
489	A ETAP C8	3. KAT	23	953.767
490	A ETAP C8	3. KAT	24	937.868
491	A ETAP C8	3. KAT	25	896.445
492	A ETAP C8	3. KAT	26	1.462.318
493	A ETAP C8	ZEMİN KAT	5	1.062.482
494	A ETAP C8	ZEMİN KAT	6	912.220
495	A ETAP C8	ZEMİN KAT	7	871.614
496	A ETAP C8	ZEMİN KAT	8	1.420.851
497	A ETAP C8	ZEMİN KAT	9	1.334.853
498	A ETAP D2	ZEMİN KAT	2	1.563.594
499	B ETAP A8	5. KAT	21	1.132.637
500	A ETAP A1	1. BODRUM	1	1.686.299

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
501	A ETAP B1	1. KAT	14	631.516
502	A ETAP B1	1. KAT	16	632.346
503	A ETAP B1	2. KAT	23	667.208
504	A ETAP B1	3. KAT	28	1.175.001
505	A ETAP B3	1. KAT	17	652.736
506	A ETAP C1	3. KAT	21	908.175
507	A ETAP C1	ZEMİN KAT	1	752.656
508	A ETAP C18	3. KAT	19	736.629
509	A ETAP C2	2. KAT	13	679.686
510	A ETAP C2	3. KAT	21	931.547
511	A ETAP C6	2. KAT	16	878.871
512	A ETAP C8	1. KAT	10	705.026
513	A ETAP C8	4. KAT	28	725.053
514	A ETAP C9	4. KAT	25	692.903
515	A ETAP E4	3. KAT	11	1.962.276
516	B ETAP A4	4. KAT	19	1.131.787
517	B ETAP A8	6. KAT	28	1.498.490
518	B ETAP C3	2. KAT	16	703.124
519	B ETAP C4	2. KAT	16	709.673
520	B ETAP C4	2. KAT	21	1.467.978
521	B ETAP C4	3. KAT	22	716.222
522	B ETAP C4	3. KAT	23	943.919
523	B ETAP C4	4. KAT	28	722.335
524	B ETAP C5	4. KAT	29	976.049
525	B ETAP F1	2. KAT	7	1.565.851
